




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






Nome do Empreendimento:

CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES HABITACIONAIS PADRÃO POPULAR

Endereço, Município e Estado:

RUA 06, ESQ. C/ RUA 23 s/nº, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA, LOTEAMENTO
CIDADE JARDIM, CATALÃO/GO

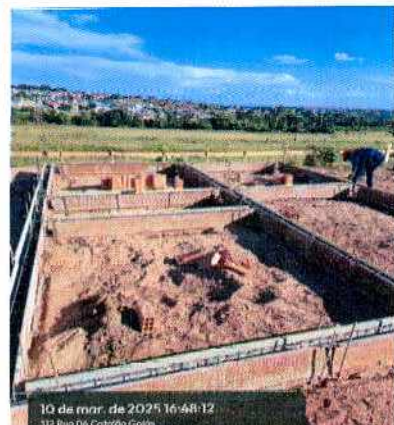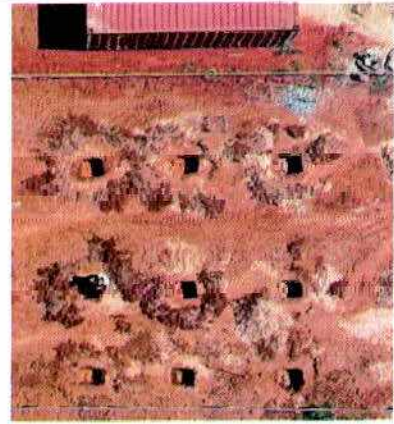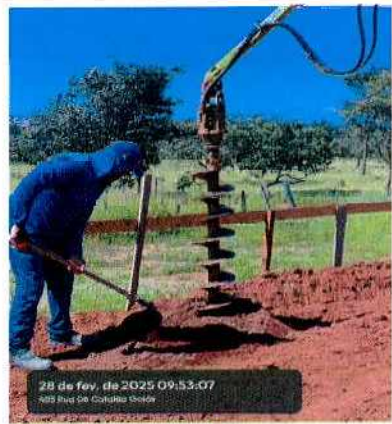Observações:

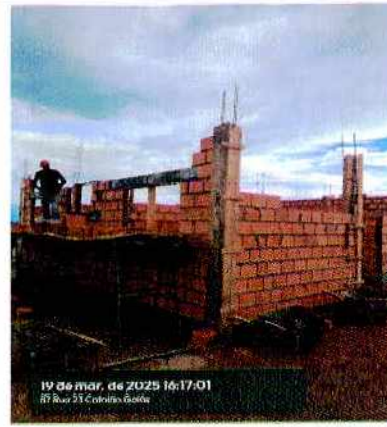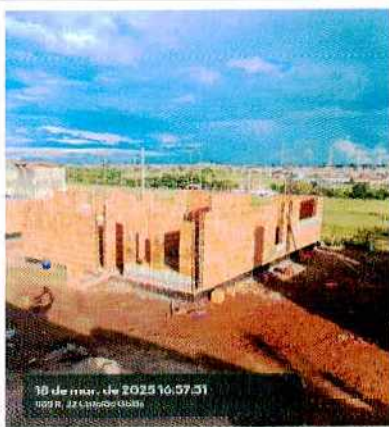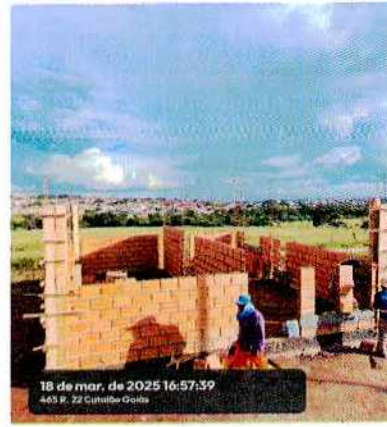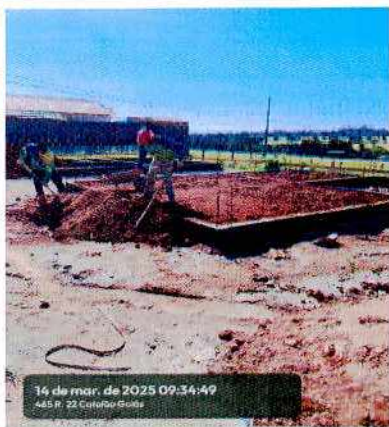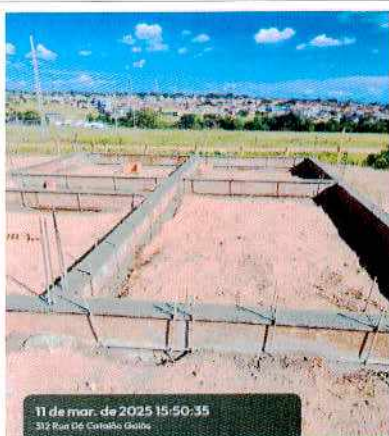

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 138/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 018/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM.

ENDEREÇO: RUA 06, ESQ. C/ RUA 23, QD. ÚNIDA, LTS. 12ª A 19ª ÁREA DO DMD. nº 2.683/2024, LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, MUNICÍPIO DE CATALÃO

CONTRATADA: ELO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR, NO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

Obra Geral

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 17,67% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a locação de container, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica, chegando assim o grupo em um total de 22,25%.
- Transporte: No período referente a esta medição, foram executados 2,49% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a mobilização de container e carga, manobra e descarga de container, chegando o grupo em um total de 97,50% já executado.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, permanecendo em um total de 80,00% já executado.
- Administração: No período referente a esta medição, foi contabilizado 18,00% referente aos pagamentos referentes a este grupo.

Obra por casa

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 87,50% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a locação de obra, chegando assim o grupo em um total de 87,50%.
- Transporte: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, foram executados 38,65% dos serviços relacionados a este grupo, referente escavação manual de valas e início do reaterro com apiloamento mecânico, fornecimento e transporte de solo, chegando o grupo em um total de 38,65% já executado.
- Fundações e sondagens: No período referente a esta medição, foram iniciados os serviços relacionados a este grupo, com 87,50% dos serviços concluídos, no que tange a execução de estacas, lastro de brita, forma de tabua, preparo e lançamento de concreto e os aços, desta forma, o total acumulado chega a 87,50%.
- Estrutura: No período referente a esta medição, foram executados 19,90% dos serviços relacionados a este grupo, referente as vergas e contravergas, forma de tabuas, aços preparo e lançamento de concreto, chegando o grupo em um total de 19,90% já executado.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, foram executados 50,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente a alvenaria de vedação com tijolo furado.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, foram executados 82,60% dos serviços relacionados a este grupo, referente a impermeabilização das vigas baldrame, chegando o grupo em um total de 82,60% já executado.
- Estrutura de madeira: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Cobertura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Forro: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Esquadrias de madeira: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Vidros: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Ferragens: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 1,98% dos serviços relacionados a este grupo, referente a instalação do padrão de energia, chegando o grupo em um total de 1,98% já executado.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 0,54% dos serviços relacionados a este grupo, referente a instalação o kit cavalete para hidrômetro, chegando o grupo em um total de 0,54% já executado.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1

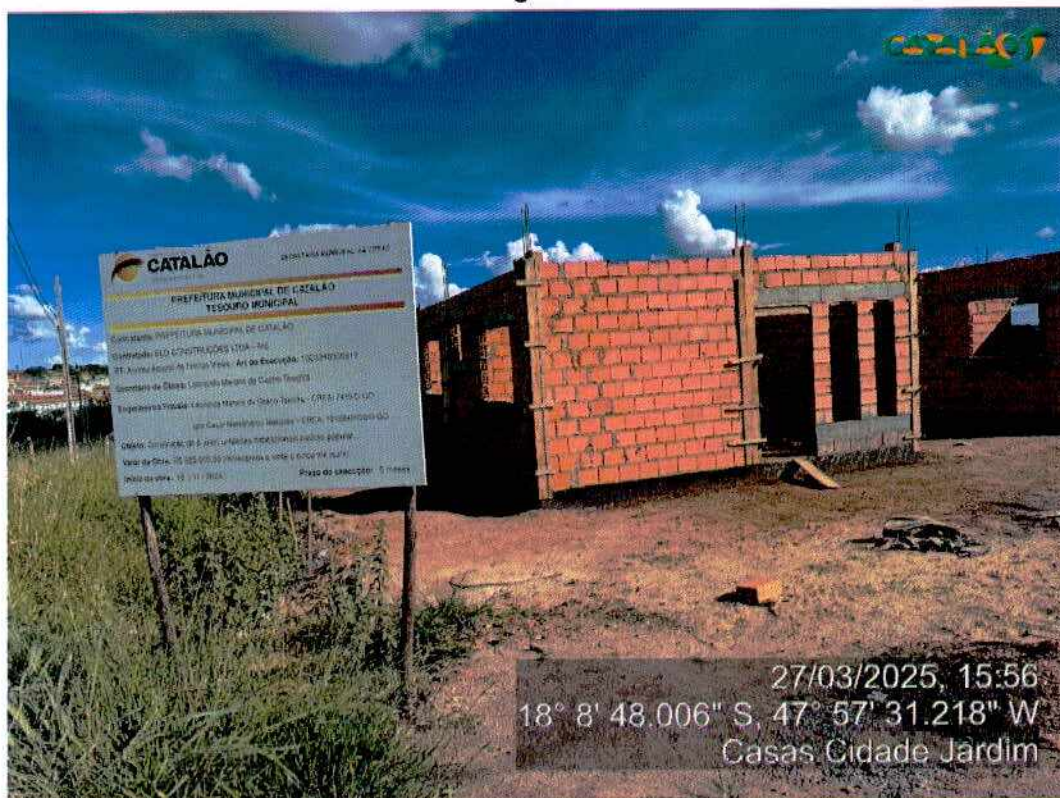


Figura 2

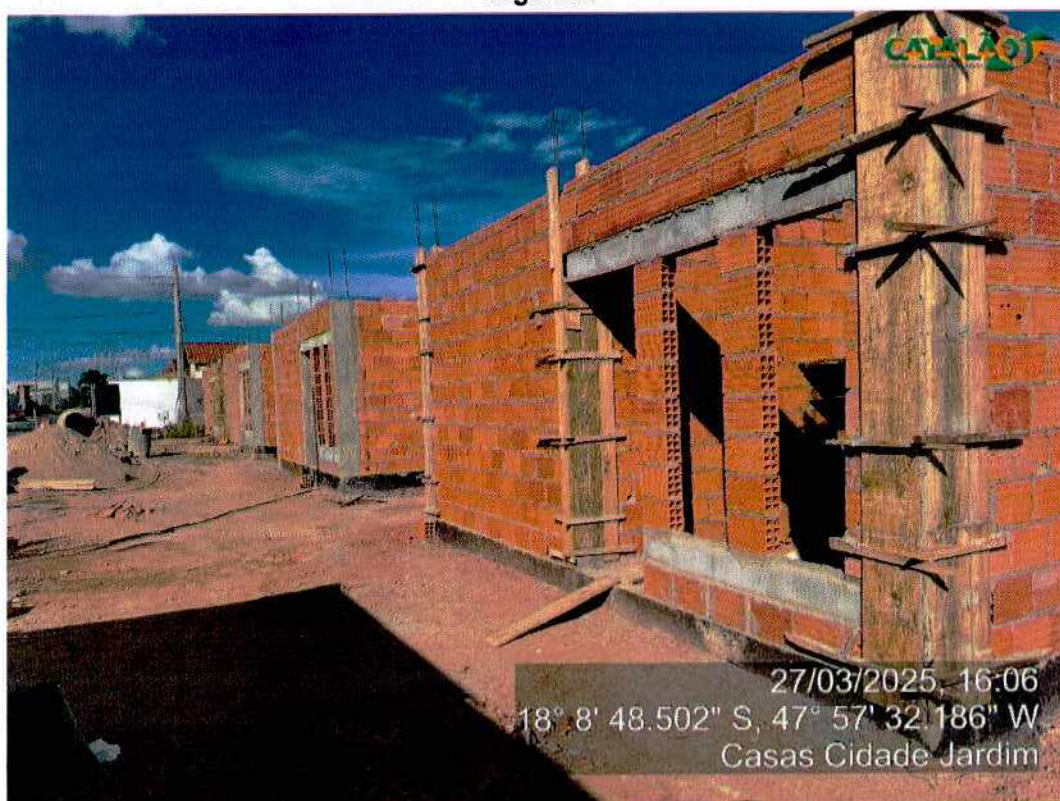


Figura 3

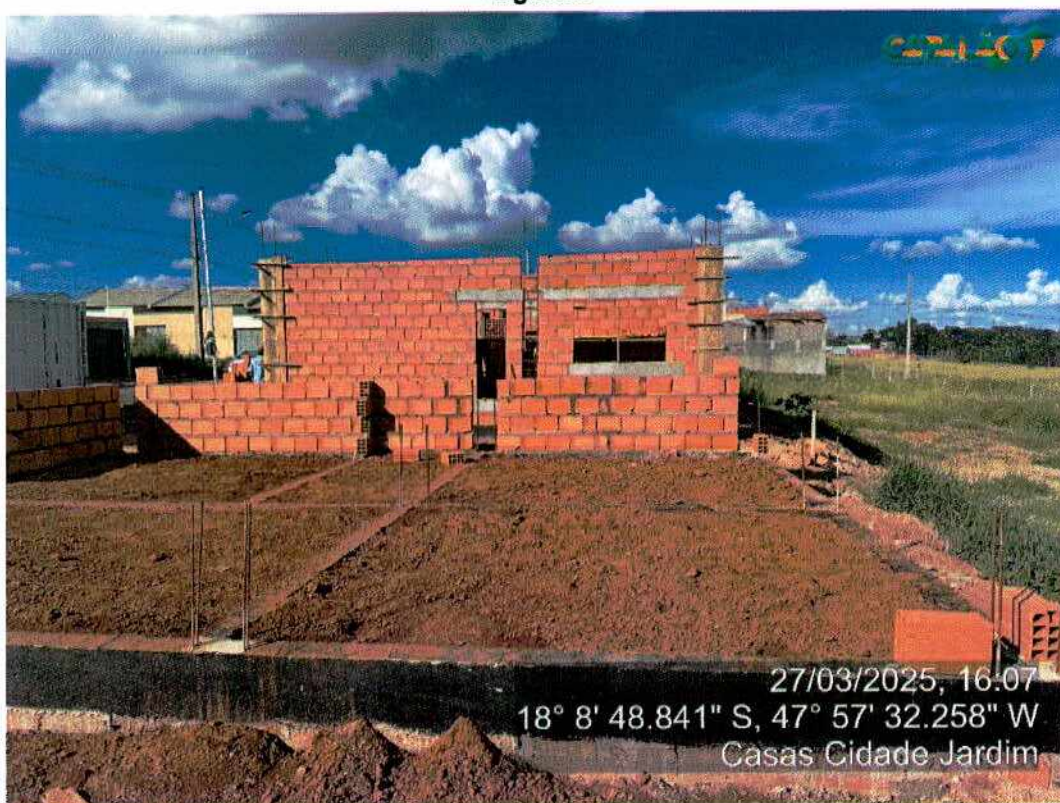


Figura 4



Figura 5

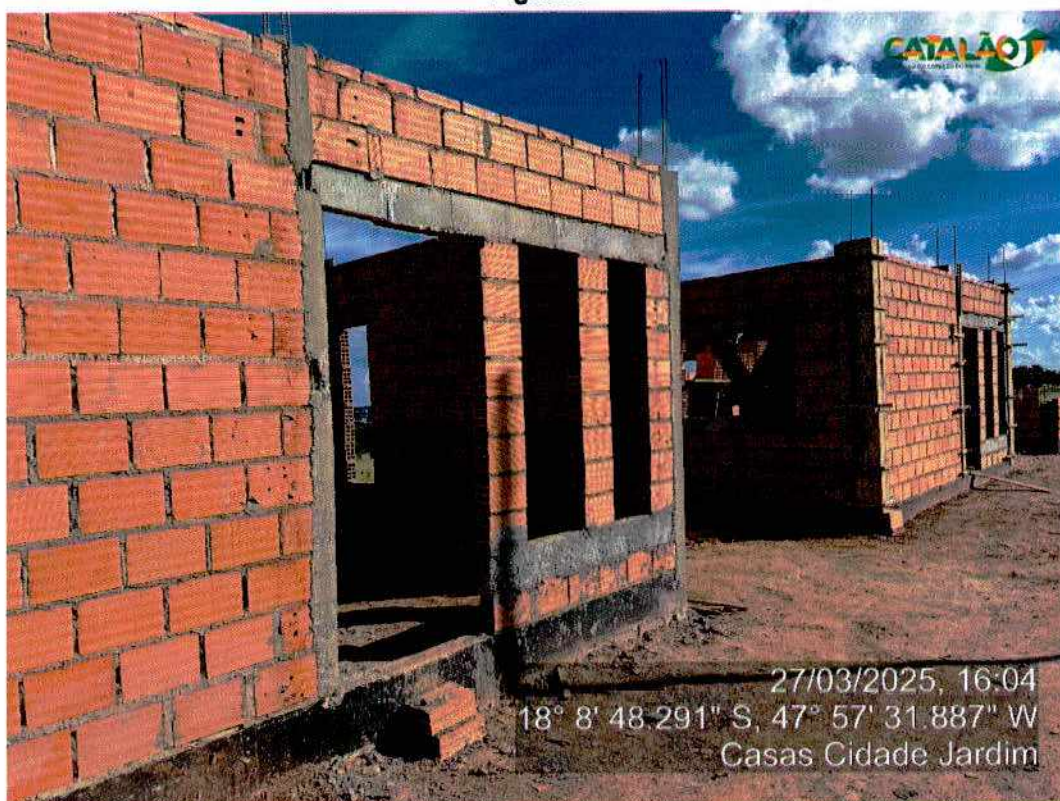


Figura 6

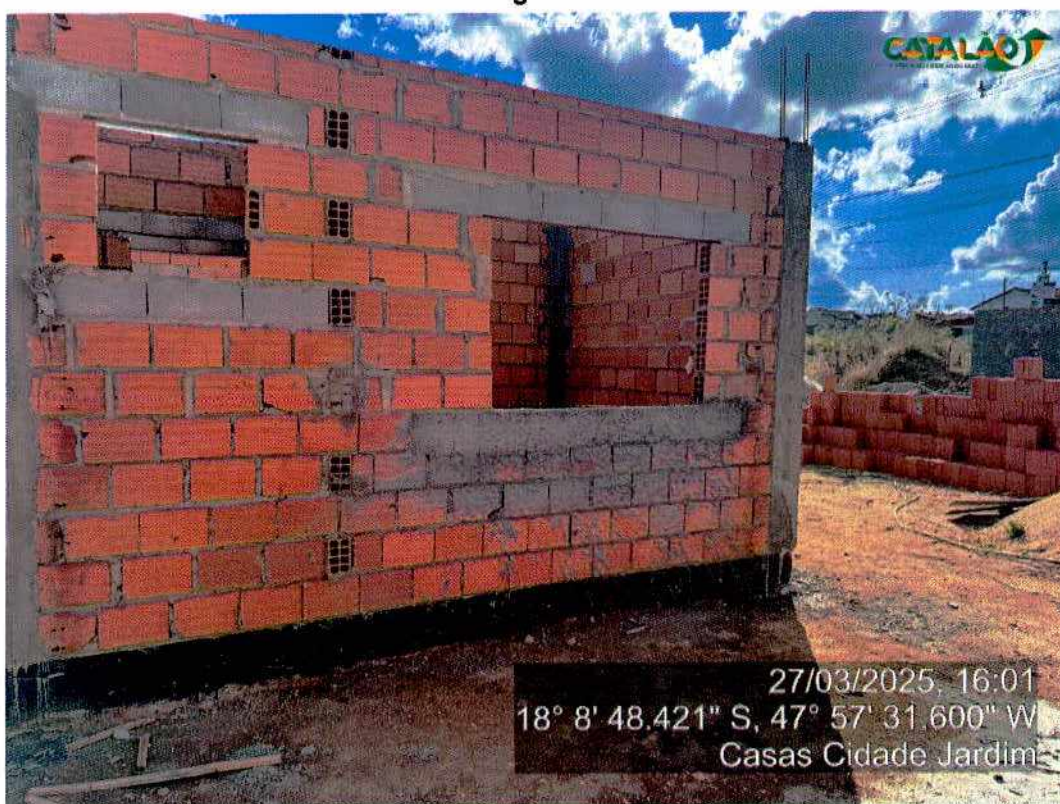


Figura 7

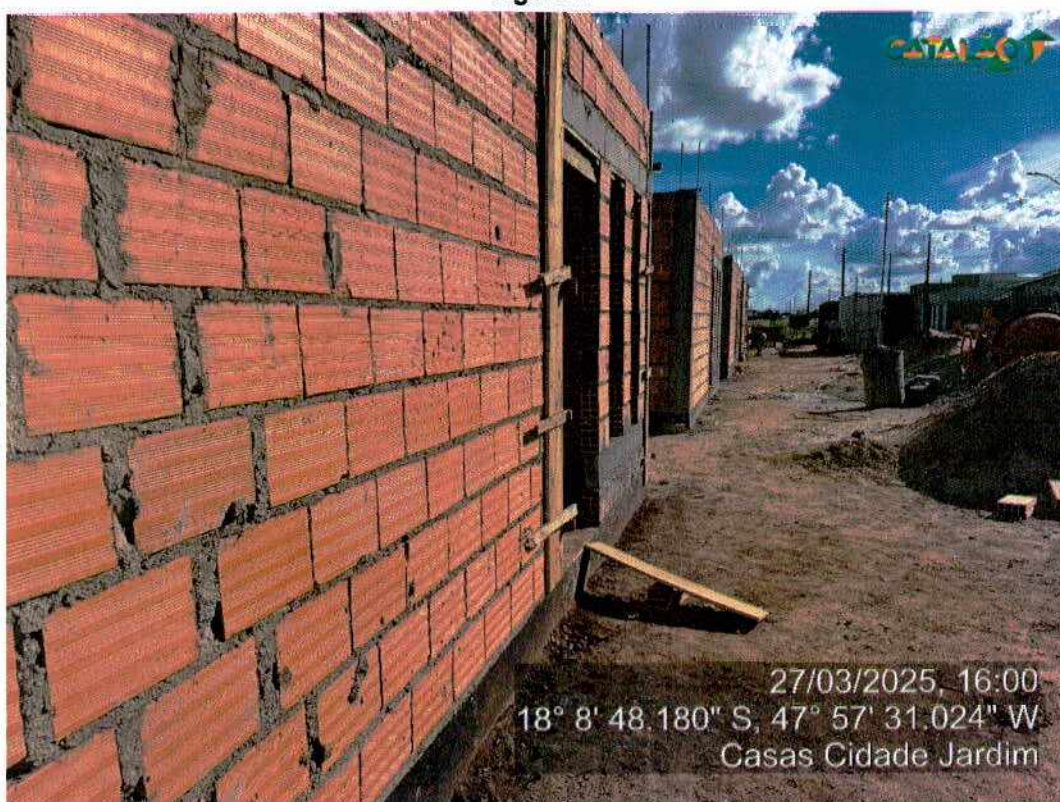


Figura 8

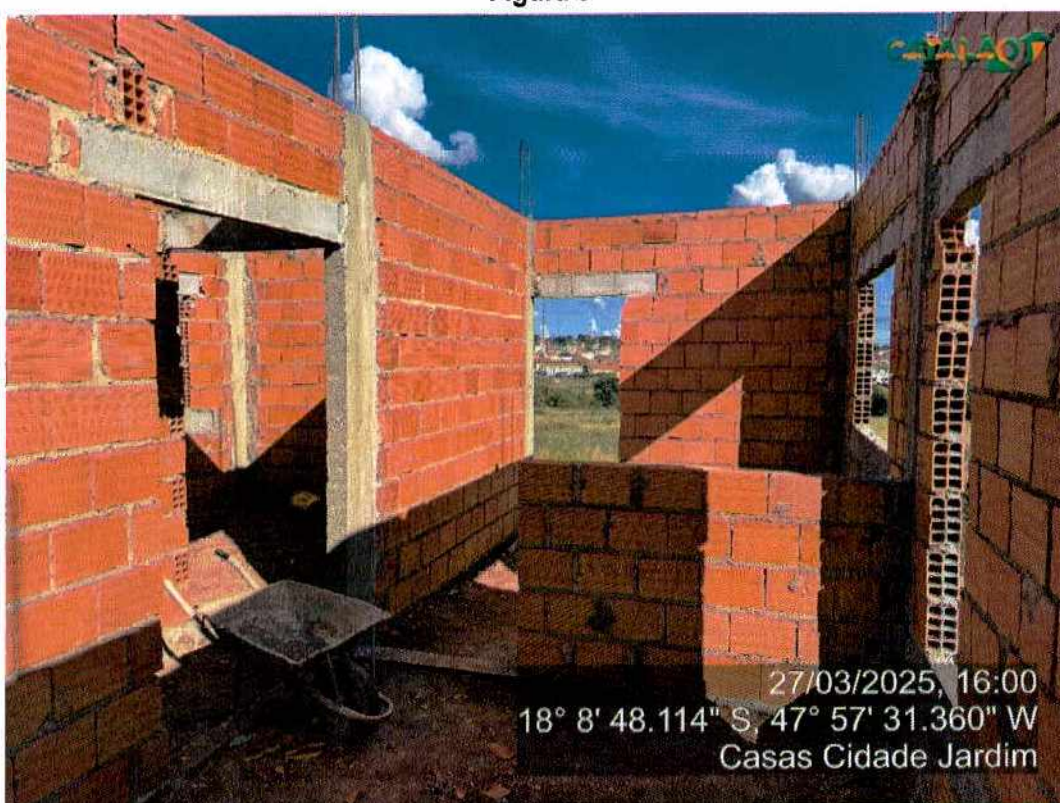


Figura 9



Catalão (GO), 02 de abril de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Ação Urbana
Secretaria Municipal de Obras
