

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 076/2024

**PROCESSO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2024

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR

**ENDEREÇO:** AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI.

**CONTRATADA:** ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.

### 1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR, localizada no Bairro Evelina Nour no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 5º (quinto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

### 2. Laudo técnico

#### 2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 5º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 6,24% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a consumo de água e energia elétrica e locação de container, chegando assim o grupo em um total de 100,00%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 1,78% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 5,70% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a escavação manual de valas e reaterro com apiloamento, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.

- Fundações e sondagens: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacadas a concretagem das fundações e armação, utilizando concreto, aço e formas.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrames, utilização de concreto, aço e formas.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 9,98% dos serviços relacionados a este grupo, referente às instalações de cabos, padrão trifásico, caixa de passagem e caixa de inspeção, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 14,97% dos serviços relacionados a este grupo, referente à irrigação automatizada chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Alvenarias e divisórias: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.
- Impermeabilização: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a impermeabilização de vigas baldrames.
- Estrutura de madeira: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a execução de toda a estrutura de madeira e materiais utilizados.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram executados 7,17% dos serviços relacionados a este grupo, referente à execução de piso de ladrilho hidráulico, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.

- **Administração:** Foi realizado o equivalente a 15,00% dos serviços, tendo sido constatados pagamentos relacionados a engenheiro, mestre de obra, topógrafo e vigia de obras, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- **Revestimento de parede:** Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados o chapisco comum e reboco.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, foram realizados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente à execução de pintura látex acrílica, pintura de tinta esportiva, demarcação de quadras/vagas com tinta poliesportiva, pintura esmalte alquídico e pintura verniz em madeira, chegando o grupo em um total de 100,00% dos serviços já executados.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram realizados 72,62% dos serviços relacionados a este grupo, referente a execução de obelisco para placa de inauguração, rede de vôlei, traves para futebol, suportes para tabela de basquete, tabela de basquete, alambrado em tudo industrial, instalação de equipamento de ginástica, lixeira dupla, conjunto de mesas e bancos de concreto, carrossel para 20 lugares, escorregador e gangorra metálicos para parques infantis e balanço de três lugares, chegando o grupo em um total de 100,00% dos serviços já executados.
- **Paisagismo:** No período referente a esta medição, foram realizados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao plantio de grama, muda de arbusto, magnólia rosa, jasmin manga, resedá rosa, agave dragão, buxinho, tumbergia, primavera, abertura de cava, jacarandá de minas, ipê rosa e branco, flamboyant vermelho e abertura de cava, chegando o grupo em um total de 100,00% dos serviços já executados.

[EM BRANCO]

### 3. Relatório Fotográfico

**Figura 1**



**Figura 02**



Figura 03

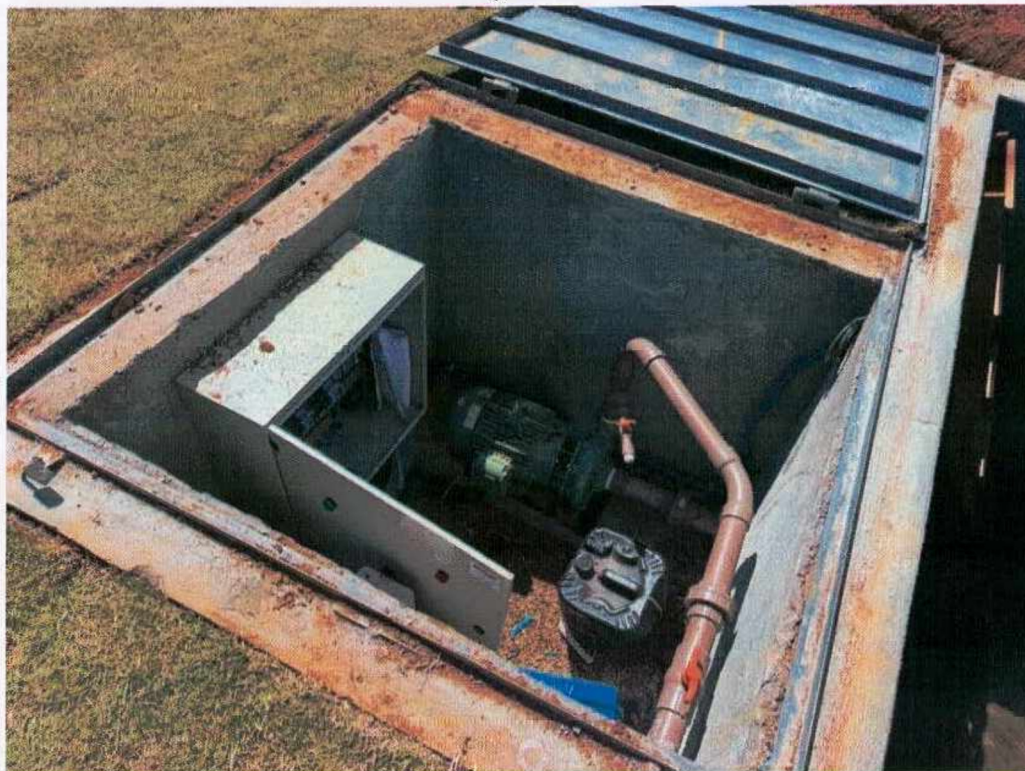


Figura 04



Figura 05



Figura 06



Figura 07



Figura 08



**Figura 09**




**Figura 10**



**Figura 11**



**Figura 12**

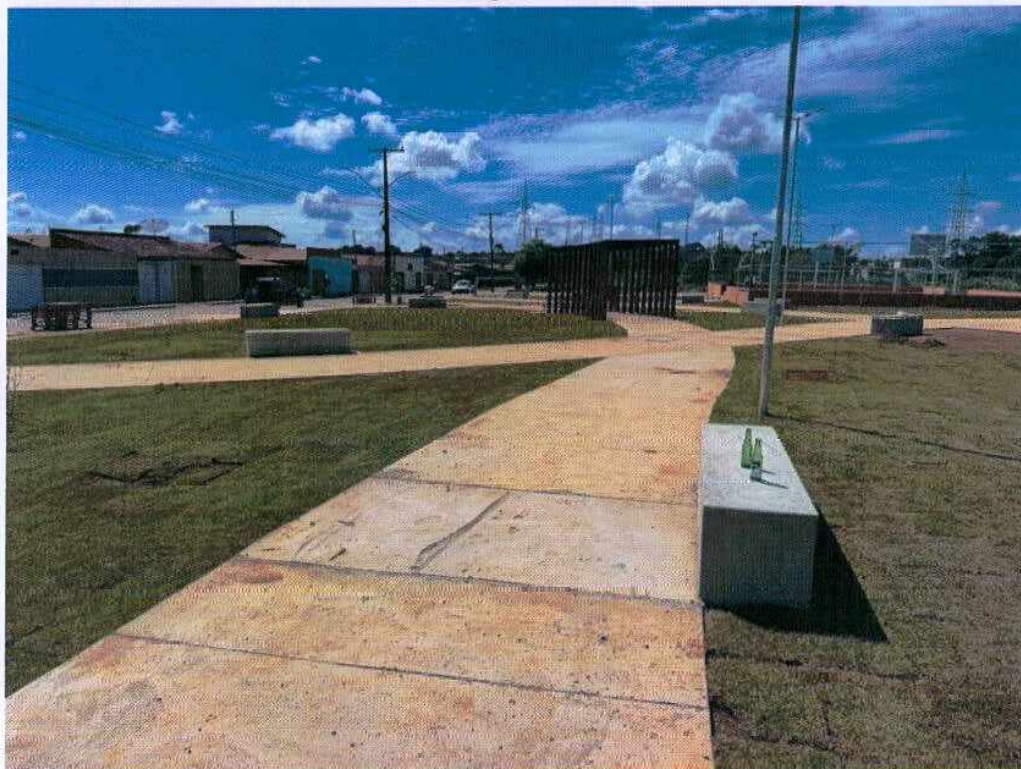

**Figura 13**



**Figura 14**



Figura 15



Figura 16



Figura 17



Figura 18



Figura 19



Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25



Catalão, 26 de dezembro de 2024.



**LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA**

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil
