

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO: 123/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 016/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE OLHOS D'ÁGUA

ENDEREÇO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CATALÃO

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

### 1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE OLHOS D'ÁGUA, localizada na Zona Rural no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

### 2. Laudo técnico

#### 2.1. Serviços executados

- **Serviços Preliminares:** No período desta medição, foram executados 21,56% dos serviços deste grupo, totalizando 100% de avanço acumulado.
- **Transporte:** Foram executados 36,15% dos serviços, atingindo 100% do total previsto para este grupo.
- **Serviços em Terra:** Foram executados 0,45% dos serviços, totalizando 100% do avanço acumulado.
- **Fundações e Sondagens** Foram executados 4,14% dos serviços, alcançando 100% de execução acumulada.

**Leandro Damas de Oliveira**  
Assessor Especial de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

- **Estrutura:** Foram executados 10,76% dos serviços, resultando em 100% de conclusão do grupo.
- **Instalações Elétricas** Foram executados 55,39% dos serviços deste grupo, totalizando 100% do previsto.
- **Instalações Hidrossanitárias:** Foram executados 15,55% dos serviços, alcançando um total de 100% já concluído.
- **Alvenarias e Divisórias:** Este item foi concluído na 2ª medição.
- **Impermeabilização:** Foram executados 7,88% dos serviços, especificamente na impermeabilização dos rebaixos de banheiros, concluindo 100% do grupo.
- **Estrutura Metálica:** Foram instaladas tesouras e terças, concluindo 100% dos serviços previstos para este grupo.
- **Cobertura:** Foram executados 7,02% dos serviços, concluindo 100% do grupo..
- **Esquadrias de Madeira:** Este item foi concluído totalizando 100%.
- **Esquadrias Metálicas:** Este item foi concluído totalizando 100%.
- **Vidros:** Este item foi concluído totalizando 100%.
- **Revestimento de Parede:** Foram realizados 13,17% dos serviços, concluindo 100% do grupo, com destaque para o revestimento cerâmico e instalação de pingadeiras no muro.
- **Forro:** Concluídos 100% dos serviços previstos neste grupo durante a medição.

- **Revestimento de Piso:** Este item foi concluído totalizando 100%.
- **Ferragens:** Foram executados 100% dos serviços previstos para este grupo nesta medição.
- **Administração:** Foi executado 29,52% dos serviços, totalizando 70,48% do grupo já realizado.
- **Pintura:** Foram executados 38,17% dos serviços, totalizando 100% de avanço acumulado.
- **Diversos:** Foram executados 38,17% dos serviços, totalizando 100% de avanço acumulado.

### 3. Relatório Fotográfico

Figura 1



**Leandro Damas de Oliveira**  
Assessor Especial de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras

Figura 2

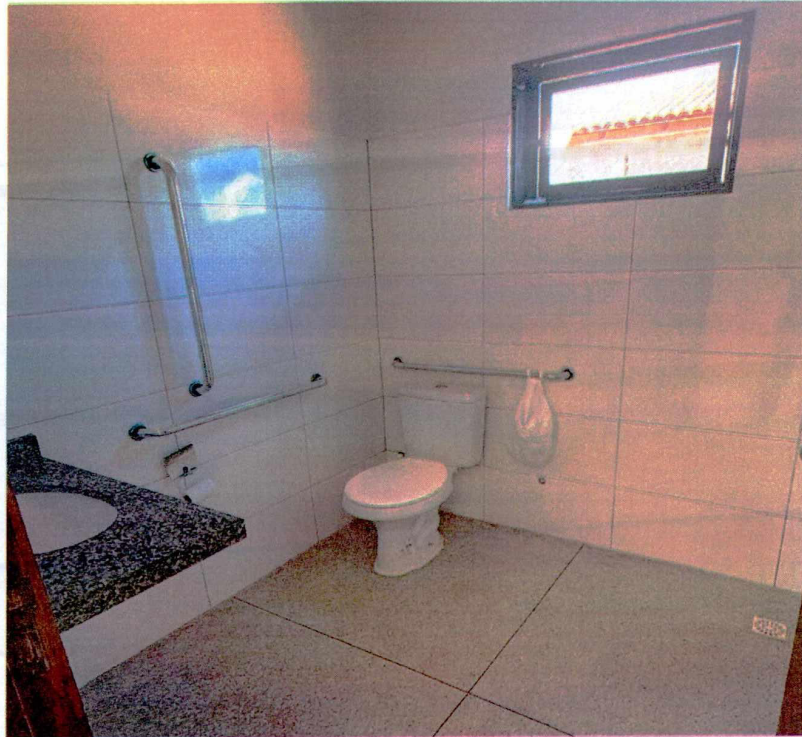


Figura 3

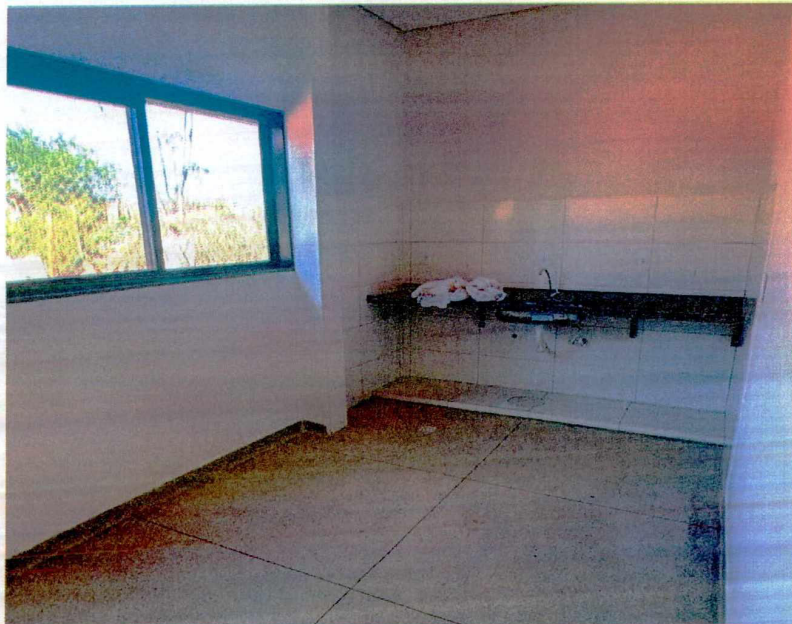


Figura 4

**Leandro Damas de Oliveira**  
Assessor Especial de Engenharia  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras



Catalão, 26 de junho de 2025

**LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA**  
Engenheiro Civil  
Fiscal da Obra
