

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO: 123/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 016/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE OLHOS D'ÁGUA

ENDEREÇO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CATALÃO

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE OLHOS D'ÁGUA, localizada na Zona Rural no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

- **Serviços Preliminares:** No período desta medição, foram executados 32,16% dos serviços deste grupo, totalizando 78,44% de avanço acumulado.
- **Transporte:** Foram executados 7,12% dos serviços relacionados ao transporte de entulho em caçamba estacionária, atingindo 63,85% do total previsto para este grupo.
- **Serviços em Terra:** Não houve execução de serviços neste grupo durante o período desta medição.
- **Fundações e Sondagens:** Não foram executados serviços neste grupo no período.
- **Estrutura:** Não houve execução de serviços neste grupo durante esta medição.



- **Instalações Elétricas:** Foram executados 55,39% dos serviços deste grupo, totalizando 66,37% do previsto.
- **Instalações Hidrossanitárias:** Foram executados 30,44% dos serviços, alcançando um total de 84,45% já concluído.
- **Alvenarias e Divisórias:** Este item foi concluído na 2ª medição.
- **Impermeabilização:** Foram executados 7,88% dos serviços, especificamente na impermeabilização dos rebaixos de banheiros, concluindo 100% do grupo.
- **Estrutura Metálica:** Foram instaladas tesouras e terças, concluindo 100% dos serviços previstos para este grupo.
- **Cobertura:** Este item foi concluído na 2ª medição.
- **Esquadrias de Madeira:** Não houve início dos serviços deste grupo nesta medição.
- **Esquadrias Metálicas:** Não foram iniciados serviços deste grupo durante o período.
- **Vidros:** Não houve início dos serviços deste grupo nesta medição.
- **Revestimento de Parede:** Foram realizados 13,17% dos serviços, concluindo 100% do grupo, com destaque para o revestimento cerâmico e instalação de pingadeiras no muro.
- **Forro:** Concluídos 100% dos serviços previstos neste grupo durante a medição.
- **Revestimento de Piso:** Foram executados 66,57% dos serviços, totalizando 85,95% do avanço acumulado.
- **Ferragens:** Não houve início dos serviços deste grupo nesta medição



- **Administração:** Foi executado 22,20% dos serviços, referentes aos pagamentos de engenheiro e encarregado, totalizando 70,48% do grupo já realizado.
- **Pintura:** Foram executados 46,64% dos serviços, totalizando 61,83% de avanço, incluindo serviços de emassamento e pintura.
- **Diversos:** Foram realizados 24,85% dos serviços deste grupo, totalizando 45,17% de execução, com destaque para a instalação do alambrado.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2

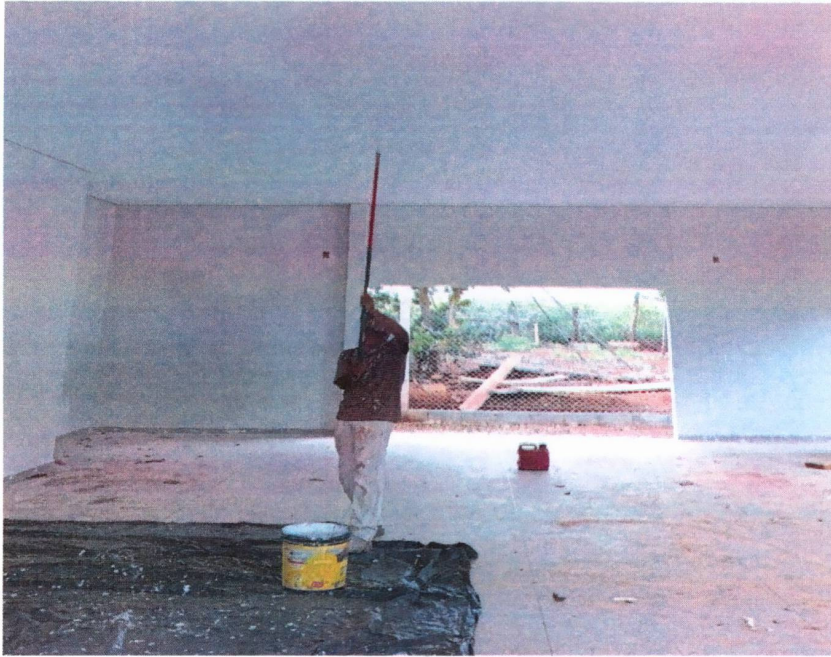


Figura 3


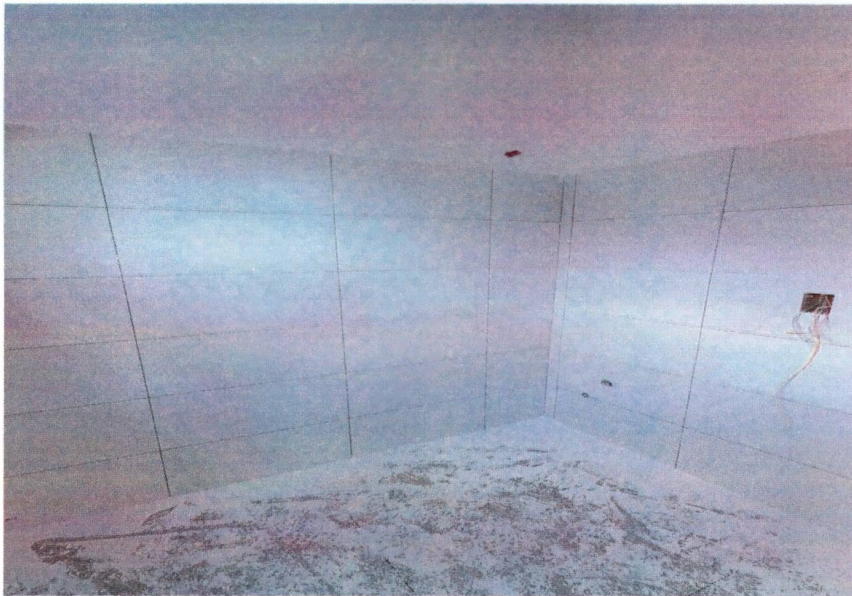


Figura 4

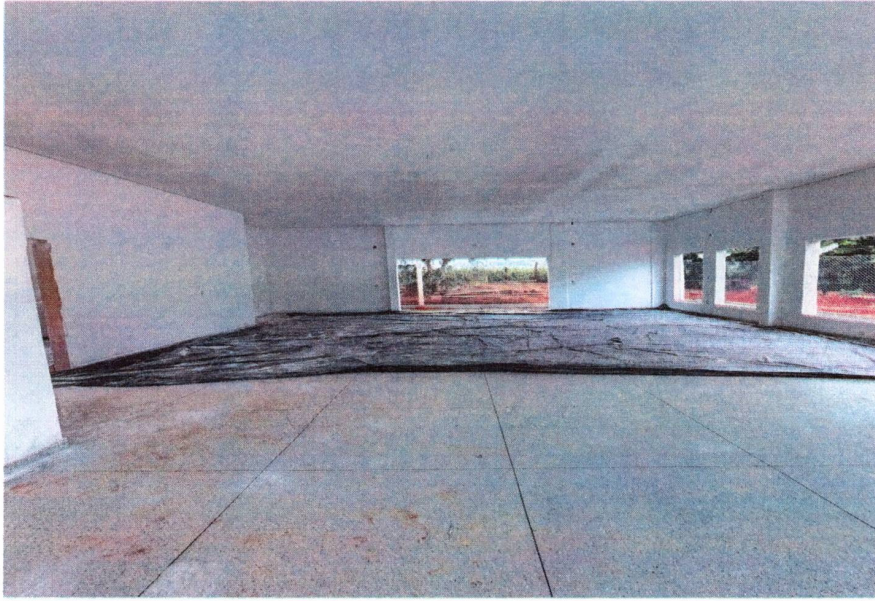

Catalão, 21 de maio de 2025

LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil

Fiscal da Obra
