

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 141/2024.

**PROCESSO:** Concorrência Eletrônica 020/2024

**OBJETO:** Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde

**ENDEREÇO:** Rua das Violetas, esquina com Rua Tenente Coronel João C. Neto, s/nº, Bairro Primavera, Catalão/GO, CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Coliseu Construtora EIRELI

### 1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção de uma Unidade Básica de Saúde no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 2º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

### 2. Laudo Técnico

#### 2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 2º Boletim de Medição analisado:

**Serviços Preliminares:** Durante o período avaliado, foram executados **19,43%** dos serviços deste grupo, incluindo locação de um contêiner, locação de obra e consumos de energia elétrica e água, totalizando 81,97% já executados.

**Transporte:** Foram concluídos **52,84%** dos serviços relacionados, abrangendo transporte de entulho por caminhão e caçamba estacionária, totalizando 58,80% dos serviços executados referentes a esse grupo.

**Serviços em Terra:** Foram concluídos cerca de **88,96%** dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciado a terra para aterro.

**Fundações e Estrutura:** Concluídos **31,8%**, sendo evidenciado **64,03%** dos serviços de fundações e **43,97%** dos serviços referentes a alvenaria.

**Impermeabilização:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.



**Cobertura:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Revestimento de Piso, Paredes e Tetos:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Esquadrias:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Instalações Elétricas:** Foram concluídos cerca de 2,60% dos serviços referentes a este grupo, sendo evidenciado a entrada de energia trifásica.

**Instalações Hidrossanitárias:** Foram concluídos cerca de 0,29% dos serviços referentes a este grupo, sendo evidenciado o kit cavalete e hidrômetro.

**PCIP (Projeto Contra Incêndio e Pânico):** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Rede de Gases Medicinais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Climatização:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Comunicação Visual:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Pintura:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Diversos e Limpeza:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Administração Local:** Foram executados **11,65%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **14,65%**.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 2º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

  
Igor C. Nascimento Marques  
Engenheiro Civil  
Fiscal



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*fm*





*[Handwritten signature]*



## Relatório Fotográfico

|                        |               |                       |            |                        |            |
|------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>            | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b>           | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 03/02/2025 |
| <b>Período inicial</b> | 01/02/2025    | <b>Período final</b>  | 28/02/2025 |                        |            |



MURO

  
 Igor C. N. Marques  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras

|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 04/02/2025 |



MURO

*Igor C. N. Marques*  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras

|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 05/02/2025 |



TERRAPLANAGEM



TERRAPLANAGEM

*Igor C. N. Marques*  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras



|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 06/02/2025 |



TERRAPLANAGEM



TERRAPLANAGEM

*Igor C. N. Marques*  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras



|                           |                                  |                                   |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Obra</b> 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> 16/12/2025 |
| <b>Local</b> 1 - Obra     |                                  | <b>Data</b> 07/02/2025            |



TERRAPLANAGEM



COMPACTAÇÃO



CAMADAS DE COMPACTAÇÃO



COMPACTAÇÃO

  
Igor C. N. Marques  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras

|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 10/02/2025 |



MURO CHAPISCADO

*Igor C. N. Marques*  
 Igor C. N. Marques  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras



|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 12/02/2025 |



GABARITO



GABARITO

  
 Igor C. N. Marques  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras

|                           |                                  |                                   |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Obra</b> 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> 16/12/2025 |
| <b>Local</b> 1 - Obra     |                                  | <b>Data</b> 14/02/2025            |



GABARITO



LOCAÇÃO




LOCAÇÃO


*Igor C. N. Marques*  
 Igor C. N. Marques  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras



|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 17/02/2025 |

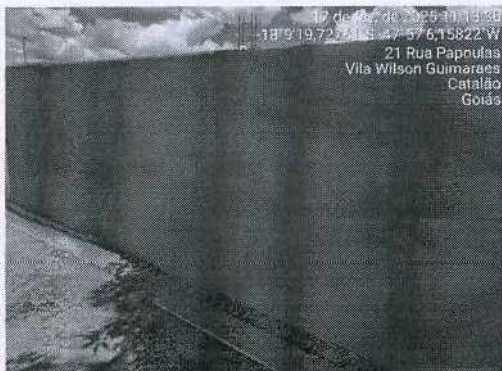

REBOCO DO MURO

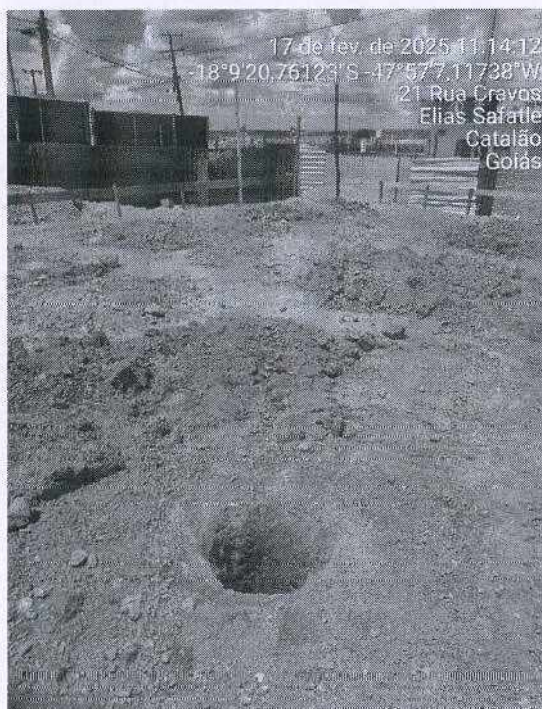

ESTACAS



PERFURAÇÃO

*Igor C. N. Marques*  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras

|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 20/02/2025 |



CONCRETAGEM ESTACAS

*Igor C. N. Marques*  
 Igor C. N. Marques  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras



|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 24/02/2025 |



ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS

*Igor C. N. Marques*  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretária de Obras

|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 25/02/2025 |




BLOCO

*Igor C. N. Marques*  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras



|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 26/02/2025 |

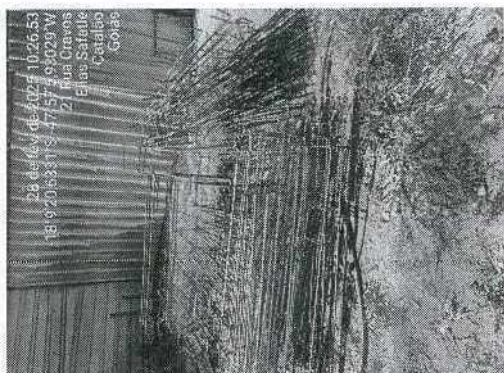

ARRANQUES

Igor C. N. Marques  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras

|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 27/02/2025 |



ESTACAS RESERVATORIO

  
Igor C. N. Marques  
Prefeitura Municipal de Catalão  
Secretaria de Obras



|              |               |                       |            |                        |            |
|--------------|---------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Obra</b>  | 36 - UBS CAIC | <b>Início da obra</b> | 16/12/2024 | <b>Término da obra</b> | 16/12/2025 |
| <b>Local</b> | 1 - Obra      |                       |            | <b>Data</b>            | 28/02/2025 |



ARMAÇÃO VIGAS

  
**Igor C. N. Marques**  
 Prefeitura Municipal de Catalão  
 Secretaria de Obras
