

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 7º (sétimo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no sétimo Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** Conforme informado nos últimos boletins de medição, todos os serviços pertinentes ao grupo já foram concluídos, desta forma, o total realizado para o grupo é de 100,00%.
- **Demolições:** Conforme informado nos últimos boletins de medição, todos os serviços pertinentes ao grupo já foram concluídos, desta forma, o total realizado para o grupo é de 100,00%.
- **Calçadas externas:** No período referente a esta medição, foram executados 14,36% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de ladrilho hidráulico e transporte com caminhão carroceria. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 89,22% já executado.
- **Calçadas internas:** Sem evolução.

- **Área de basquete:** No período referente a esta medição, foram executados 49,72% dos serviços relacionados a este grupo, referente à execução de passeio e de piso de concreto. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 69,83% já executado.
- **Quadra poliesportiva:** No período referente a esta medição, foram executados 42,75% dos serviços relacionados a este grupo, referente , referente à execução de passeio e de piso de concreto. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 49,17% já executado.
- **Quadras de areia:** No período referente a esta medição, foram executados 24,18% dos serviços relacionados a este grupo, referente à argila ou barro para aterro/reaterro, piso de concreto, pintura poliesportiva, meio fio e dreno. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 40,47% já executado.
- **Pista de skate:** No período referente a esta medição, foram executados 47,35% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao apiloamento, impermeabilização, locação e aos obstáculos. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 47,35% já executado.
- **Área de academia ao ar livre:** Sem evolução.
- **Pet place:** Sem evolução.
- **Playground:** Sem evolução.
- **Mobiliário urbano:** Sem evolução.
- **Área de contemplação (borda):** No período referente a esta medição, foram executados 34,16% dos serviços planejados, abrangendo ao guarda corpo, fundo anticorrosivo para esquadrias metálicas, rampa de acessibilidade e meio fio. Dessa forma, o total executado alcançou 90,73%.
- **Paisagismo:** Sem evolução.

- **Borda de Contenção da Represa:** No período referente a esta medição, foram executados 14,84% dos serviços relacionados a este grupo, referente à forma de chapa compensado e concreto. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 23,33% já executado.
- **Iluminação:** No período referente a esta medição, foram executados 10,16% dos serviços relacionados a este grupo, referente à caixa de passagem, cabos, postes e luminárias. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 78,45% já executado.
- **Administração:** No período referente a esta medição, foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados, desta forma, o percentual medido foi de 15,18%. Assim, o acumulado total deste grupo de serviço, até o momento, é de 60,76%.
- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Imagem 01



Imagem 02



Imagem 03



Imagem 04

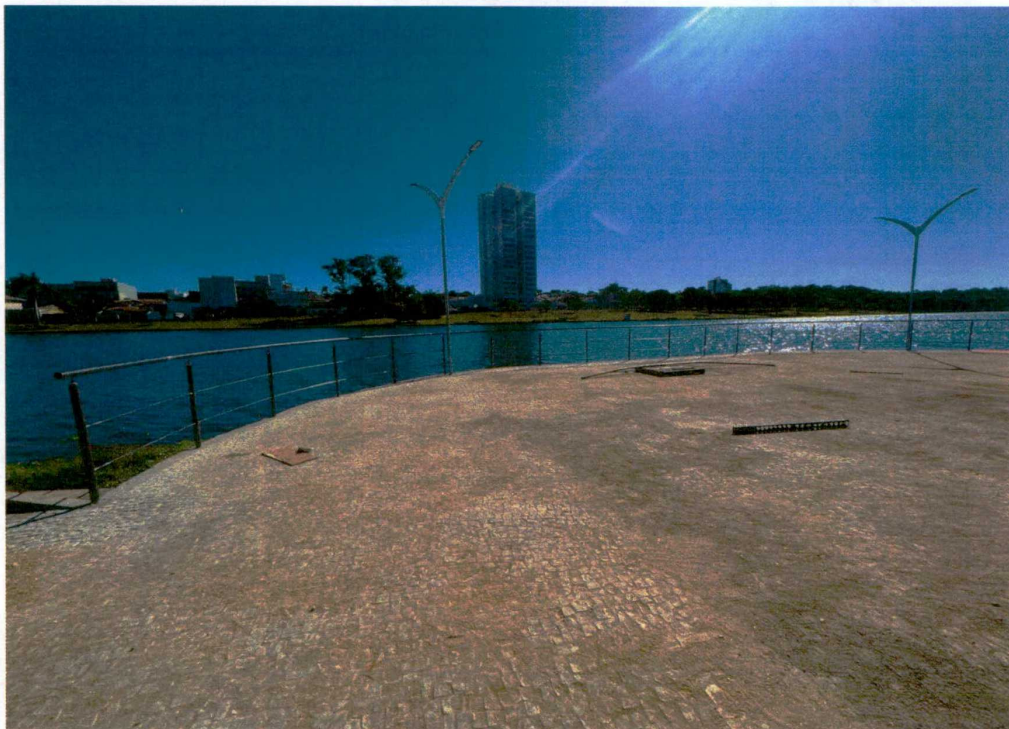


Imagem 05

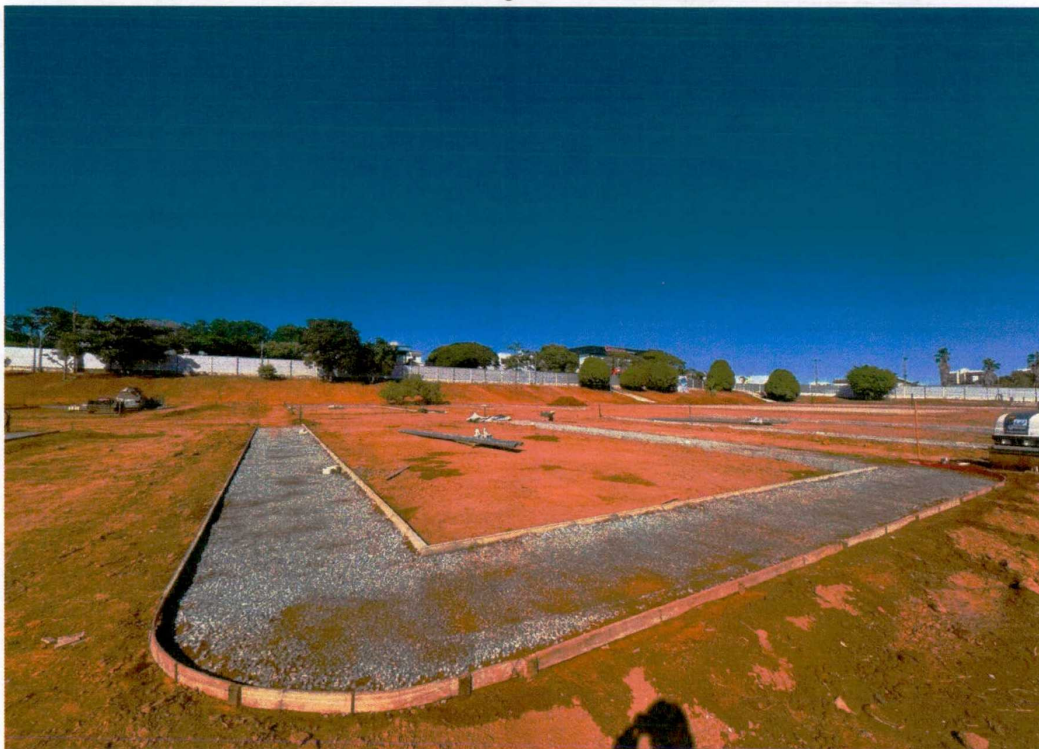


Imagem 06



Imagem 07



Imagem 08



Imagem 09



Imagem 10



Imagem 11



Imagem 12



Catalão, 08 de julho de 2024.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
