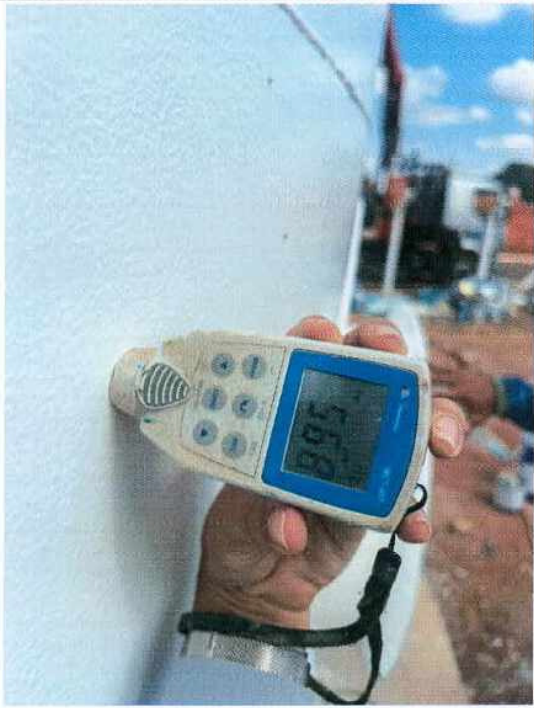



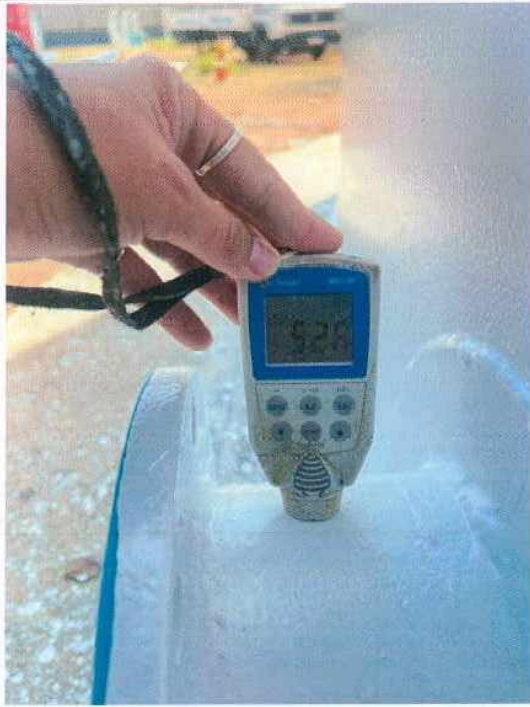
				Relatório n°	5
				Data do relatório	18/10/2024
				Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO			Prazo contratual	
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE			Prazo decorrido	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ	Prazo a vencer	

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (3)					
ENCARREGADO	PINTOR	SOLDADOR			
1	1	1			<i>Mão de Obra Própria (3)</i>

Atividades (2)		
Inspeção Externa		Em Andamento
Inspeção interna		Em Andamento


Fotos (18)	
	
Inspeção	Inspeção




Inspeção

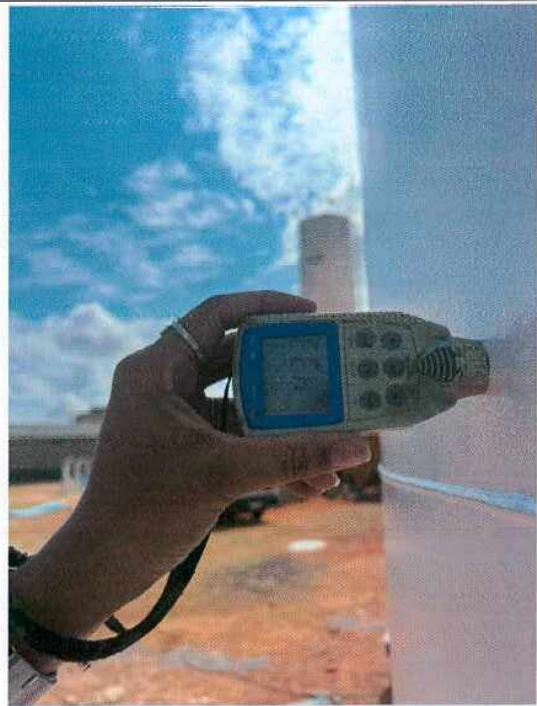


Inspeção

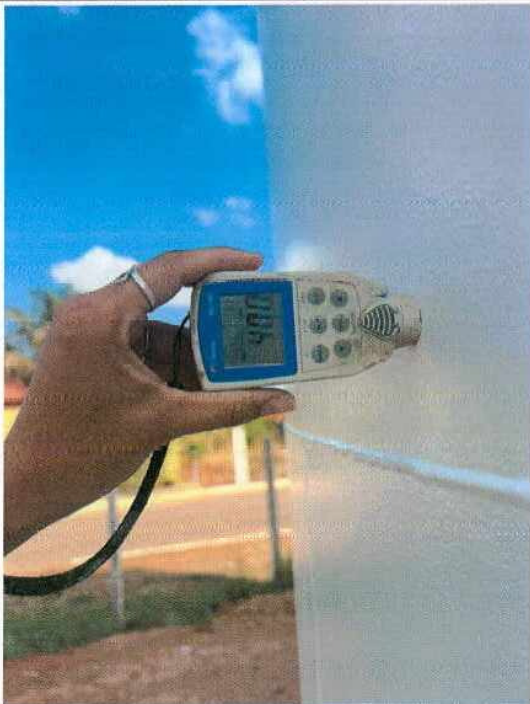


Inspeção

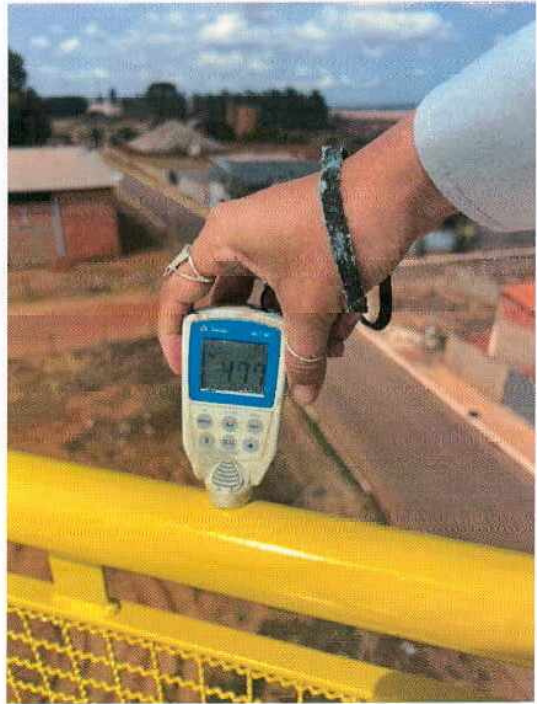


Inspeção E

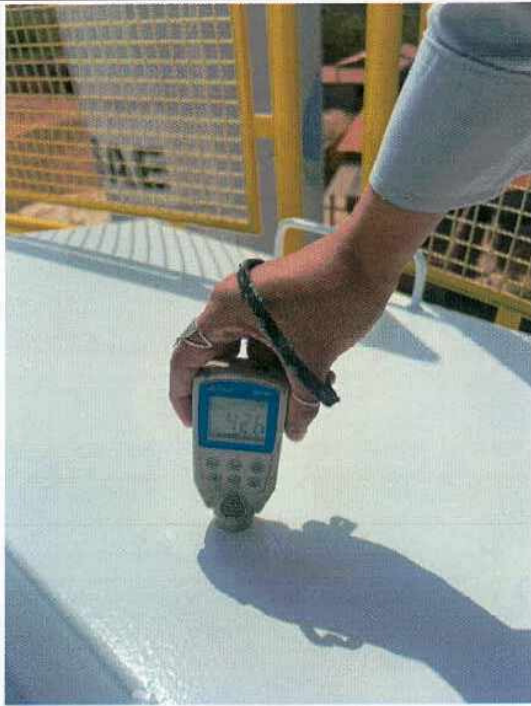

Inspeção Exte

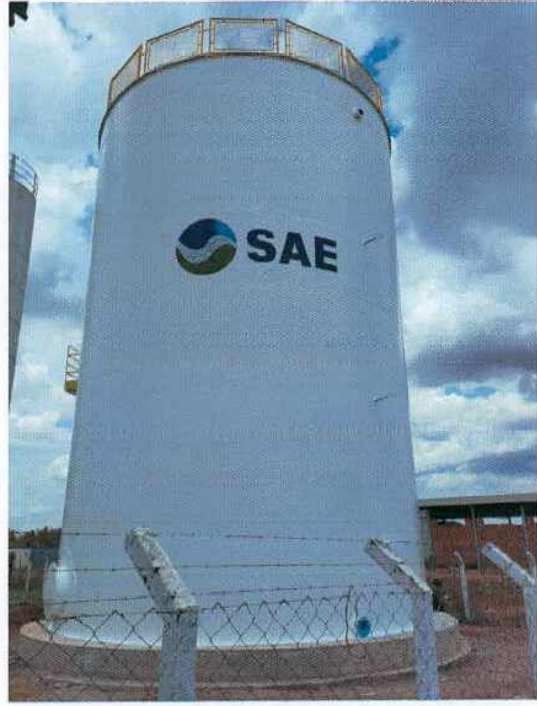


Inspeção Externa

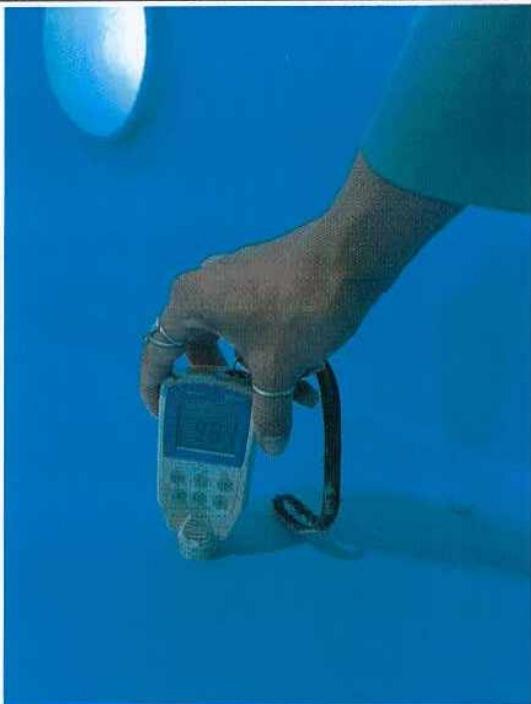

Inspeção interna




Inspeção interna

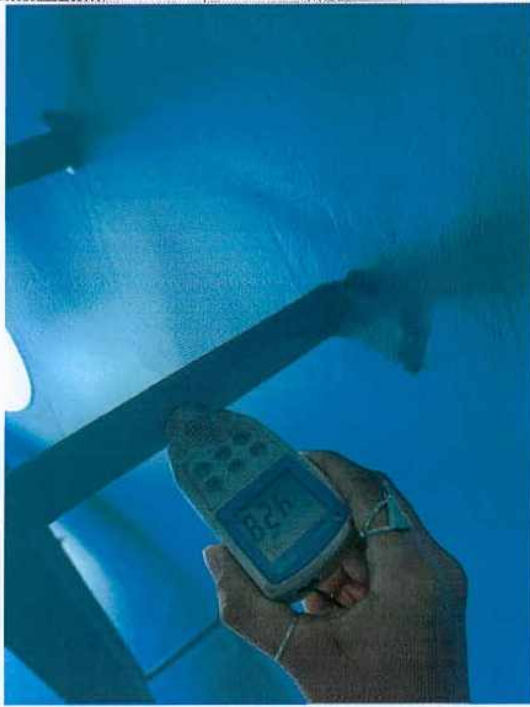

Inspeção interna



Inspeção interna

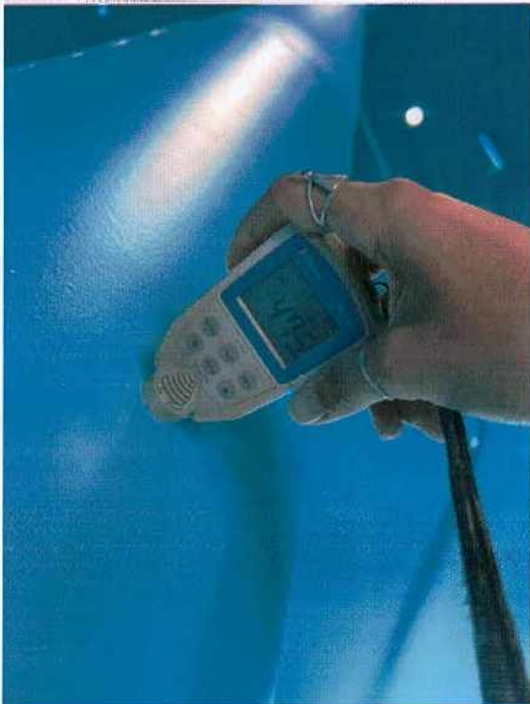

Inspeção interna



Inspeção interna



Inspeção interna



Inspeção interna



Inspeção interna



Inspeção interna

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 10206698020-GO

Assinatura

Carlos H. Rasmussen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-10204158510-GO

Assinatura

		Relatório n°	4
		Data do relatório	14/10/2024
		Dia da semana	Segunda-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável


Mão de obra (3)					
ENCARREGADO 1	PINTOR 1	SOLDADOR 1			Mão de Obra Própria (3)

Atividades (1)	
PINTURA DO RESERVATÓRIO	Em Andamento

**Fotos (2)**



PINTURA DO RESERVATÓRIO

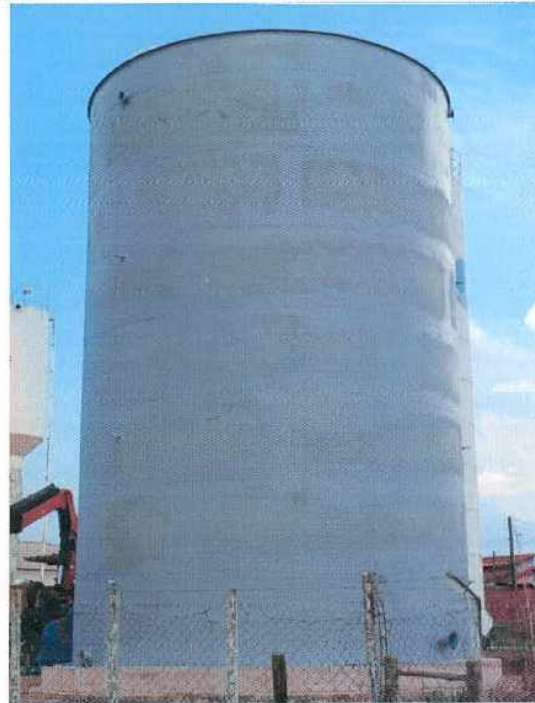

PINTURA DO RESERVATÓRIO

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 10206598820-GO

Assinatura

Carlos H. Rasmussen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-1020415831D-GO

Assinatura

		Relatório n°	6
		Data do relatório	12/10/2024
		Dia da semana	Sábado
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
ENCARREGADO 1	PINTOR 1	SOLDADOR 1			Mão de Obra Própria (3)

Atividades (1)	
Medição de espessura	Em Andamento


**Fotos (6)**



Medição de espessura



Medição de espessura

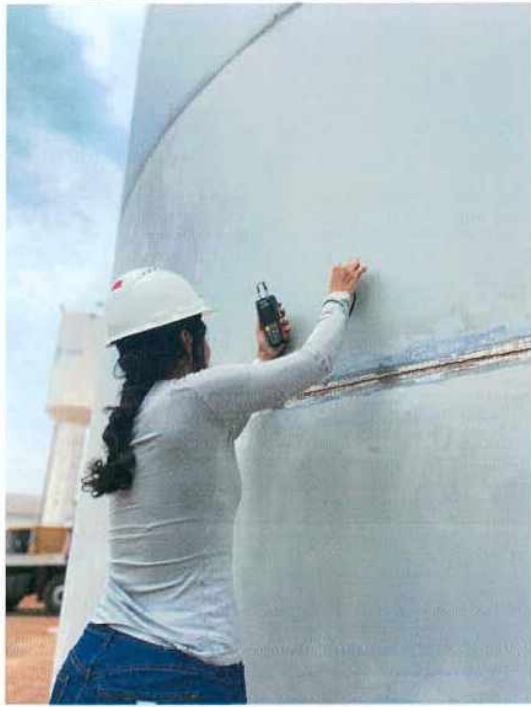

Medição de espessura



Medição de espessura



Medição de espessura



Medição de espessura

---

Assinatura

---

Assinatura


 		Relatório n°	3
		Data do relatório	11/10/2024
		Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
ENCARREGADO 1	PINTOR 1	SOLDADOR 1			Mão de Obra Própria (3)

Atividades (2)		
Teste Líquido Penetrante	0	Em Andamento
Ultrassom		Em Andamento

**Fotos (10)**

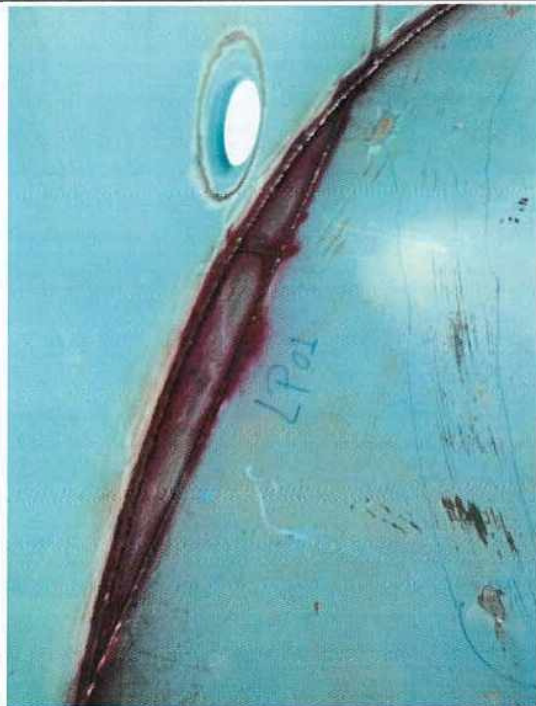

Teste Líquido Penetrante



Teste Líquido Penetrante




Teste Líquido Revelador



Teste Líquido Revelador



Ultrassom

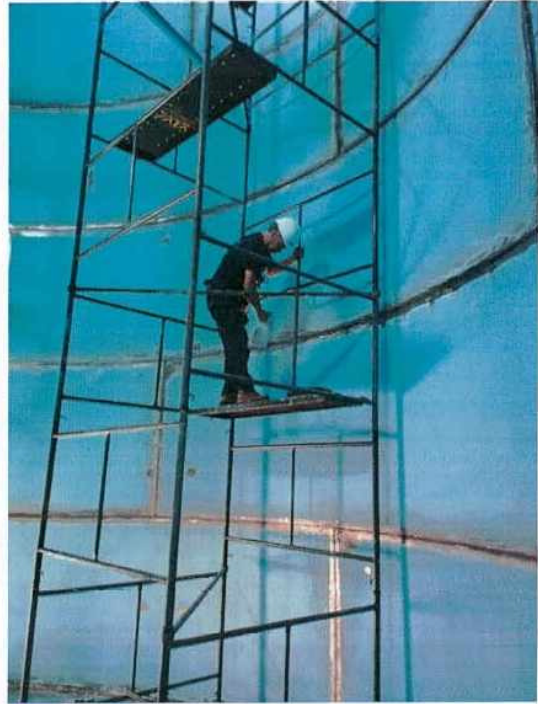


Ultrassom




Ultrassom



Ultrassom

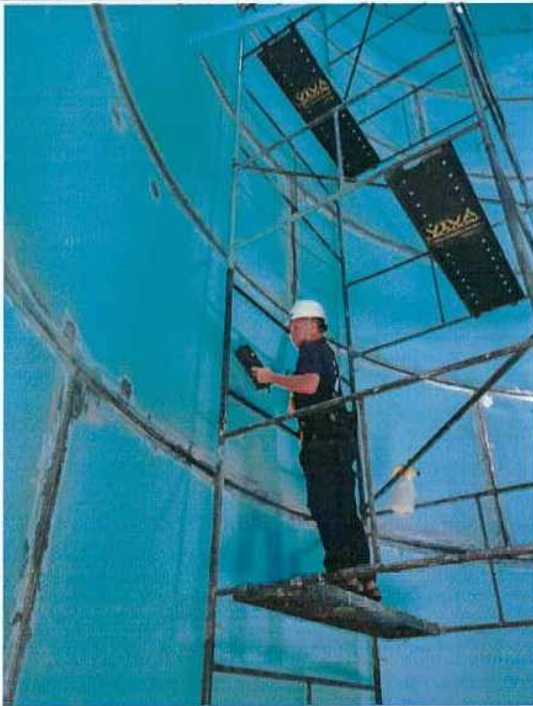

Ultrassom

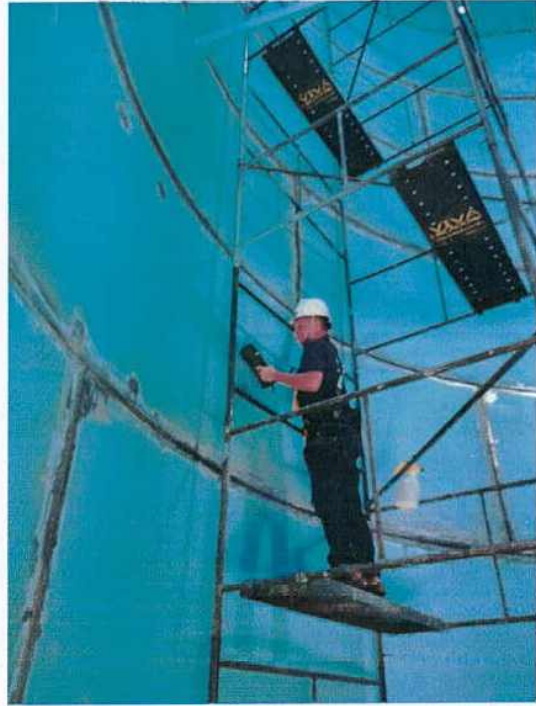

Ultrassom

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 10205598/20-GO

Assinatura

Carlos H. Rasmussen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-10204156/10-GO

Assinatura


				Relatório n°	2
				Data do relatório	10/10/2024
				Dia da semana	Quinta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>				Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO			Prazo contratual	
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE			Prazo decorrido	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ	Prazo a vencer	

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
ENCARREGADO 1	PINTOR 1	SOLDADOR 1			Mão de Obra Própria (3)

Atividades (1)		
Montagem dos acessórios	0	Em Andamento

**Fotos (1)**

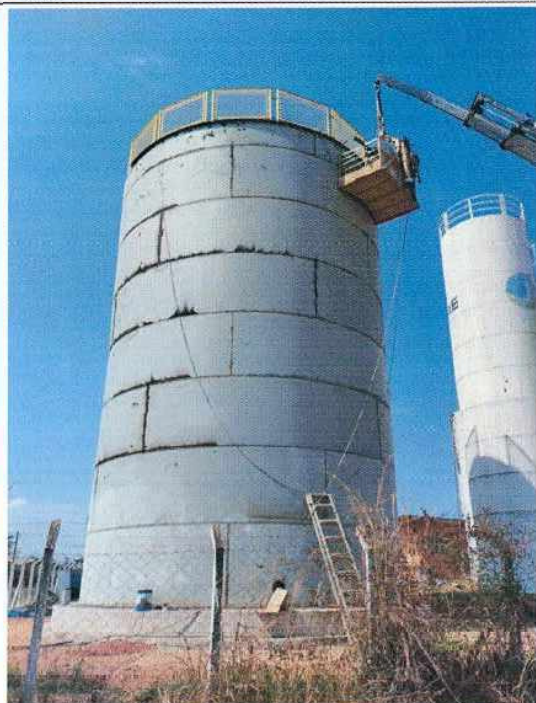

Montagem dos acessórios

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 10296599870-GO

Assinatura

Carlos H. Ramosen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-10204158510-GO

Assinatura

 		Relatório n°	1
		Data do relatório	08/10/2024
		Dia da semana	Terça-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
ENCARREGADO 1	PINTOR 1	SOLDADOR 1			Mão de Obra Própria (3)

Atividades (1)	
Montagem do Teto	Em Andamento

**Fotos (2)**



Montagem do Teto



Montagem do Teto

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 1020669827D-GO

Assinatura

Carlos H. Ramosson da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-1020415831D-GO

Assinatura



 		Relatório n°	3
		Data do relatório	06/10/2024
		Dia da semana	Domingo
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	62 dias
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	47 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	15 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)						
ENCARREGADO DE OBRA	PINTOR	SOLDADOR				Mão de Obra Própria


Equipamentos (2)						
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINA DE PINTURA					

Atividades (1)		
Montagem - Costado	0	Em Andamento

Fotos (6)	
 <p>6 de out. de 2024 06:56:26 649 Rua Seis Santo Antônio do Rio Verde Catalão Goiás</p> <p>Montagem - Costado</p>	 <p>6 de out. de 2024 06:55:57 649 Rua Seis Santo Antônio do Rio Verde Catalão Goiás</p> <p>Montagem - Costado</p>



Montagem - Costado

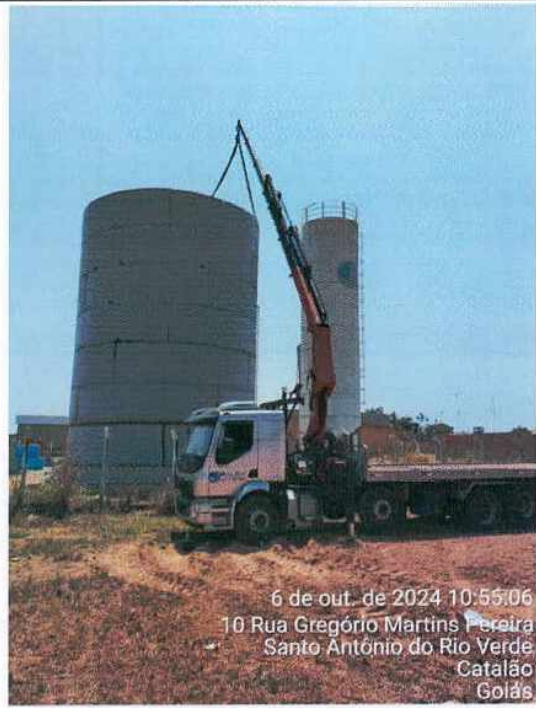

6 de out. de 2024 10:55:06  
10 Rua Gregório Martins Pereira  
Santo Antônio do Rio Verde  
Catalão  
Goiás

Montagem - Costado



Montagem - Costado



Montagem - Costado

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 10206598020-GO

Assinatura

Carlos H. Rasmussen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-1020415851D-GO

Assinatura

 		Relatório n°	2
		Data do relatório	05/10/2024
		Dia da semana	Sábado
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	62 dias
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	46 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	16 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)						
ENCARREGADO DE OBRA	PINTOR	SOLDADOR				Mão de Obra Própria

Equipamentos (2)						
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINA DE PINTURA					

Atividades (1)	
Montagem - Costado	Em Andamento

Fotos (4)	
 <p>Montagem - Costado</p>	 <p>5 de out. de 2024 10:11:38 649 Rua Seis Santo Antônio do Rio Verde Catalão Goiás</p> <p>Montagem - Costado</p>



Montagem - Costado



Montagem - Costado

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 1029669802D-GO

Assinatura

Carlos H. Rasmussen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-1020415831D-GO

Assinatura


 		Relatório n°	1
		Data do relatório	04/10/2024
		Dia da semana	Sexta-Feira
<b>Relatório Diário de Obra (RDO)</b>		Contrato	110/2024
Obra	MUNICÍPIO DE CATALÃO	Prazo contratual	62 dias
Local	RODOVIA GO-506, S/N - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE	Prazo decorrido	45 dias
Contratante	PREFEITURA	Responsável	CIRO JOSUÉ
		Prazo a vencer	17 dias
<b>Condição climática</b>		<b>Tempo</b>	<b>Condição</b>
Manhã		☀️ Claro	Praticável
Tarde		☀️ Claro	Praticável
<b>Mão de obra (3)</b>			
ENCARREGADO DE OBRA	PINTOR	SOLDADOR	Mão de Obra Própria
<b>Equipamentos (2)</b>			
MÁQUINA DE SOLDA	MÁQUINA DE PINTURA		
<b>Atividades (2)</b>			
FABRICAÇÃO DO FUNDO			Em Andamento
INÍCIO DA MONTAGEM - COSTADO			Em Andamento
<b>Fotos (6)</b>			
			
FABRICAÇÃO DO FUNDO		FABRICAÇÃO DO FUNDO	




FABRICAÇÃO DO FUNDO



FABRICAÇÃO DO FUNDO

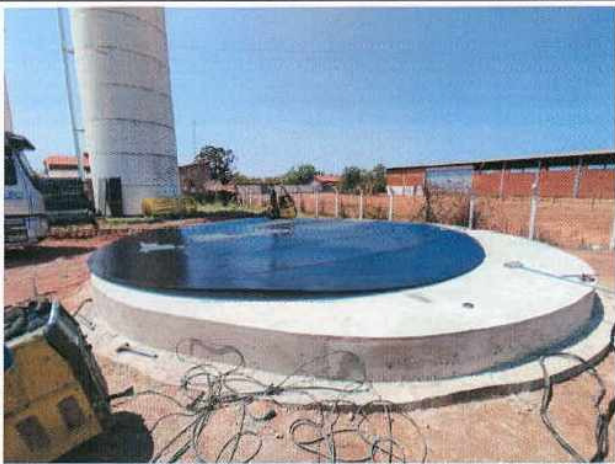

FABRICAÇÃO DO FUNDO

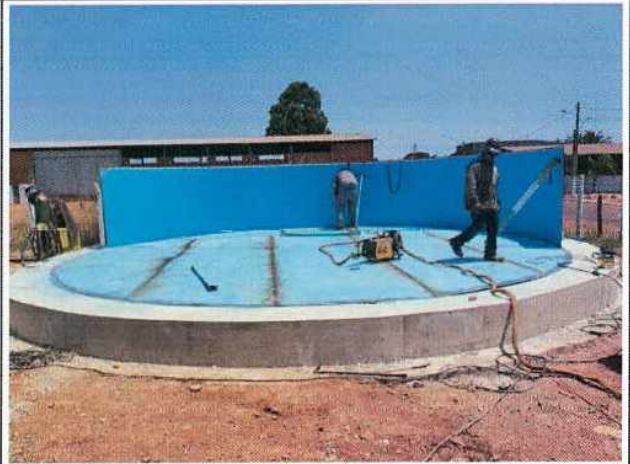

INÍCIO DA MONTAGEM - COSTADO

Vitória Gomes Pereira  
Engenheira Civil  
CREA - 1020659802D-GO

Assinatura

Carlos H. Rasmussen da Mata  
Eng. Mecânico  
CREA-1020415851D-GO

Assinatura
